
REFORMA DOS TELHADOS DA EDIFICAÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Id	Nome da Tarefa	Duração
1	**TROCA DO TELHADOS**	**180 dias**
2	Ordem de Início dos Serviços	0 dias
3	Detalhamento projeto	15 dias
4	Instalação / organização do canteiro / barracão	3 dias
5	Equipamentos de segurança coletiva / linha de vida temporária	5 dias
6	**TELHADO C06 - 14,5m2**	**8 dias**
7	Remoção completa do telhado	1 dia
8	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
9	Serviços na laje/vedações/ impermeabilização	3 dias
10	Montagem da estrutura/ pintura	2 dias
11	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	1 dia
12	**TELHADO A04 - 21,4 m2 (sem laje)**	**7 dias**
13	Desafixação do SPDA	1 dia
14	Desmonte das telhas	1 dia
15	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
16	Ajuste nas estruturas/vedações/impermeabilizações	3 dias
17	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	1 dia
18	**TELHADO A03 - 25,3 m2 (sem laje)**	**5 dias**
19	Desafixação do SPDA	1 dia
20	Desmonte das telhas	1 dia
21	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
22	Ajuste nas estruturas/vedações/impermeabilizações	1 dia
23	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	1 dia
24	**TELHADO C05 - 82,5 m2**	**20 dias**
25	Desafixação do SPDA	1 dia
26	Remoção do completa do telhado	3 dias
27	Remoção / descarte de resíduos	1 dia



REFORMA DOS TELHADOS DA EDIFICAÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Id	Nome da Tarefa	Duração
28	Serviços na laje/vedações/ impermeabilização	5 dias
29	Montagem / pintura da estrutura	5 dias
30	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	5 dias
31	**TELHADO C04 - 95,6 m2**	**20 dias**
32	Desafixação do SPDA / conduítes elétricos	1 dia
33	Remoção do completa do telhado	3 dias
34	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
35	Serviços na laje/vedações/ impermeabilização	5 dias
36	Montagem / pintura da estrutura	5 dias
37	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	5 dias
38	**TELHADO C03 - 44,5 m2**	**20 dias**
39	Desafixação do SPDA / conduítes elétricos	1 dia
40	Remoção do completa do telhado	3 dias
41	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
42	Serviços na laje/vedações/ impermeabilização	5 dias
43	Montagem / pintura da estrutura	5 dias
44	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	5 dias
45	**TELHADO A01 - 125,5m2 (sem laje)**	**22 dias**
46	Desafixação do SPDA / conduítes elétricos	2 dias
47	Desmonte das telhas	2 dias
48	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
49	Reforços na estrutura	5 dias
50	Ajuste nas estruturas/vedações/impermeabilizações	7 dias
51	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	5 dias
52	**TELHADO A02 - 17,4 m2 (sem laje)**	**10 dias**
53	Desafixação do SPDA	1 dia
54	Desmonte das telhas	1 dia

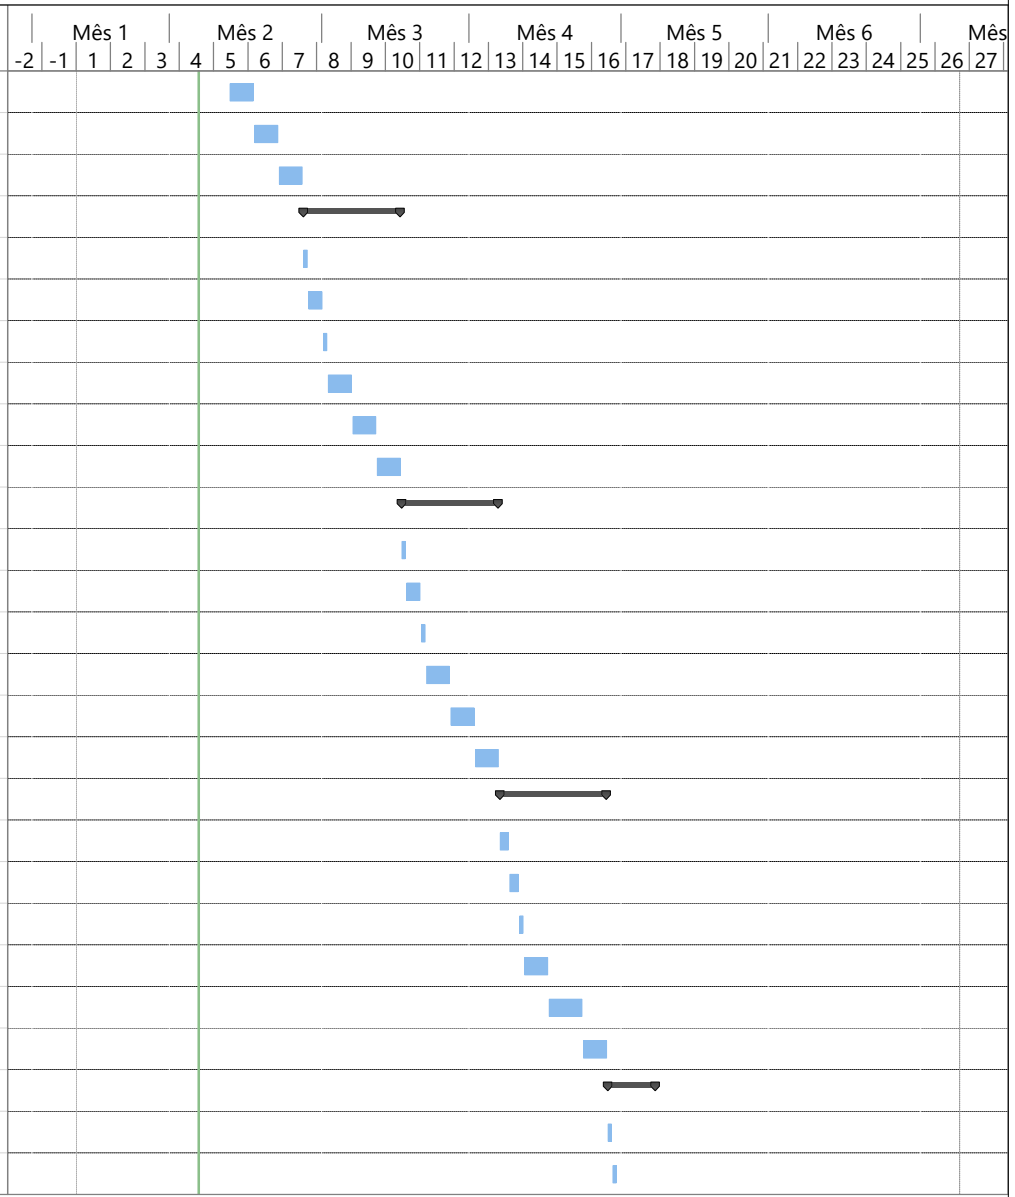

REFORMA DOS TELHADOS DA EDIFICAÇÃO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Id	Nome da Tarefa	Duração
55	Remoção / descarte de resíduos	1 dia
56	Ajuste nas estruturas/vedações/impermeabilizações	3 dias
57	Instalação do telhamento/rufos/calhas	4 dias
58	**TELHADO C01 - 127,8 m2**	**27 dias**
59	Desafixação do SPDA / conduítes elétricos	1 dia
60	Remoção do completa do telhado	5 dias
61	Remoção / descarte de resíduos	2 dias
62	Serviços na laje/vedações/ impermeabilização	7 dias
63	Montagem / pintura da estrutura	5 dias
64	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	7 dias
65	**TELHADO C02 - 117,7 m2**	**27 dias**
66	Desafixação do SPDA / conduítes elétricos	1 dia
67	Remoção do completa do telhado	5 dias
68	Remoção / descarte de resíduos	2 dias
69	Serviços na laje/vedações/ impermeabilização	7 dias
70	Montagem / pintura da estrutura	5 dias
71	Instalação do telhamento/rufos/calhas/descidas	7 dias
72	Instalação de linha de vida permanente	5 dias
73	Troca dos novos conduítes elétricos	5 dias
74	Reinstalação do SPDA	5 dias
75	Desmontagem do canteiro	2 dias
76	Limpeza Geral	1 dia
77	Entrega dos "As-builts"	1 dia
78	Término dos Serviços	0 dias

